

社会資本総合整備計画 事後評価

御代田町都市公園再整備事業

平成25年2月

長野県 御代田町

様式2-1 評価結果のまとめ

都道府県名	長野県		市町村名	御代田町		計画名	御代田町都市公園再整備事業					
交付期間	平成22年度～平成24年度		事後評価実施時期	平成24年度		交付対象事業費	77.6百万円	国費	37百万円	国費率	47.68%	
1)事業の実施状況	事業名											
	当初計画に位置づけ、実施した事業	基幹事業	都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業、公園施設長寿命化計画策定事業									
		関連事業	なし									
		効果促進事業	御代田町防犯灯改修事業									
	当初計画から削除した事業	事業名										
		削除/追加の理由										
		削除/追加による目標、指標、数値目標への影響										
	新たに追加した事業	基幹事業	なし									
		関連事業	なし									
		効果促進事業	御代田町防犯灯改修事業 周辺道路整備により実施することとしたため。 影響なし									
新たに追加した事業	基幹事業	なし										
	関連事業	なし										
	効果促進事業	御代田町雪窓球場補強改修事業 移動円滑化園路等表示看板設置事業 公園内のバリアフリー化の拡大、倉庫機能の向上を図るため。 移動円滑化整備の効果を高めるため。 指標2を追加 影響なし										
交付期間の変更	当初	平成22年度～平成24年度		交付期間の変更による事業、指標、数値目標への影響		-						
2)都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の達成状況	指標		単位	従前値		目標値		実績値	見込値	目標達成度	目標達成○、△、×の理由	
				基準年度	目標年度	目標年度						
	指標1	年度別のバリアフリー整備公園数	箇所%	0 0	H22	3 100	H24	3 100	—	○	事業実施により目標を達成した。	
指標2	年度別の改修施設公園数	箇所%	0 0	H22	1 100	H24	1 100	—	○	事業実施により目標を達成した。		
3)その他の数値指標(当初設定した数値目標以外の指標)による効果発現状況	指標		単位	従前値(比較値)		目標値		実績値	見込値	目標達成度	目標達成○、△、×の理由	
				基準年度	目標年度	目標年度						
	その他の数値指標	なし										
その他の数値指標	なし											
4)事業効果の発現状況	指標1については、事業の進捗によりバリアフリー化が図られた。 指標2については、事業の進捗により機能の向上が図られた。											
評価委員会の審議・意見	評価委員会の審議 無					理由:都市公園の移動等円滑化ガイドライン等に沿った客観性のあるものであることから自己評価とする。						
	委員構成					実施時期	担当部署		委員会設置の根拠			
	学識経験のある委員											
	その他の委員											
委員会の意見												
今後の方針	移動円滑化法に対応した公園整備が完了した。今後、策定した長寿命化計画により、計画的な公園施設の更新を行い、ハザードリスクの縮減による安全性の確保とライフサイクルコストの削減を図り、適正な維持管理を推進していく。改修した備蓄倉庫の活用を進める。											

事業の概要

御代田町都市公園再整備事業の成果

計画の目標	目標を定量化する指標		従前値		目標値		評価値	
御代田町は、活火山の浅間山の南麓に広がる地域に位置し、火山性異常気象が間欠的に発生しており噴火等の災害が予想される。また、急峻な地形であることから、豪雨などによる土砂崩落なども度々発生しており避難勧告を行った経過もある。これらの災害が発生した場合、公園は避難所として重要な公共施設であることから、施設の機能保全及び向上対策により災害に強い安全なまちづくりを目標とする。 また、現施設が都市公園移動等円滑化基準に該当しない箇所や公園遊具の危険度判定調査により改善が必要な箇所があることから、子どもや高齢者をはじめ誰もが安全で安心して利用できるよう整備を行う。	年度別のバリアフリー整備公園数	単位:箇所 %	0箇所 0%	H22	3箇所 100%	H24	100.0	H24
	年度別の改修施設公園数	単位:箇所 %	0箇所 0%	H22	1箇所 100%	H24	100.0	H24



車イス利用者用駐車場整備



雪窓球場スタンド改修



バリアフリー園路整備




バリアフリートイレ整備



移動円滑化園路表示看板整備



ベビーシート設置

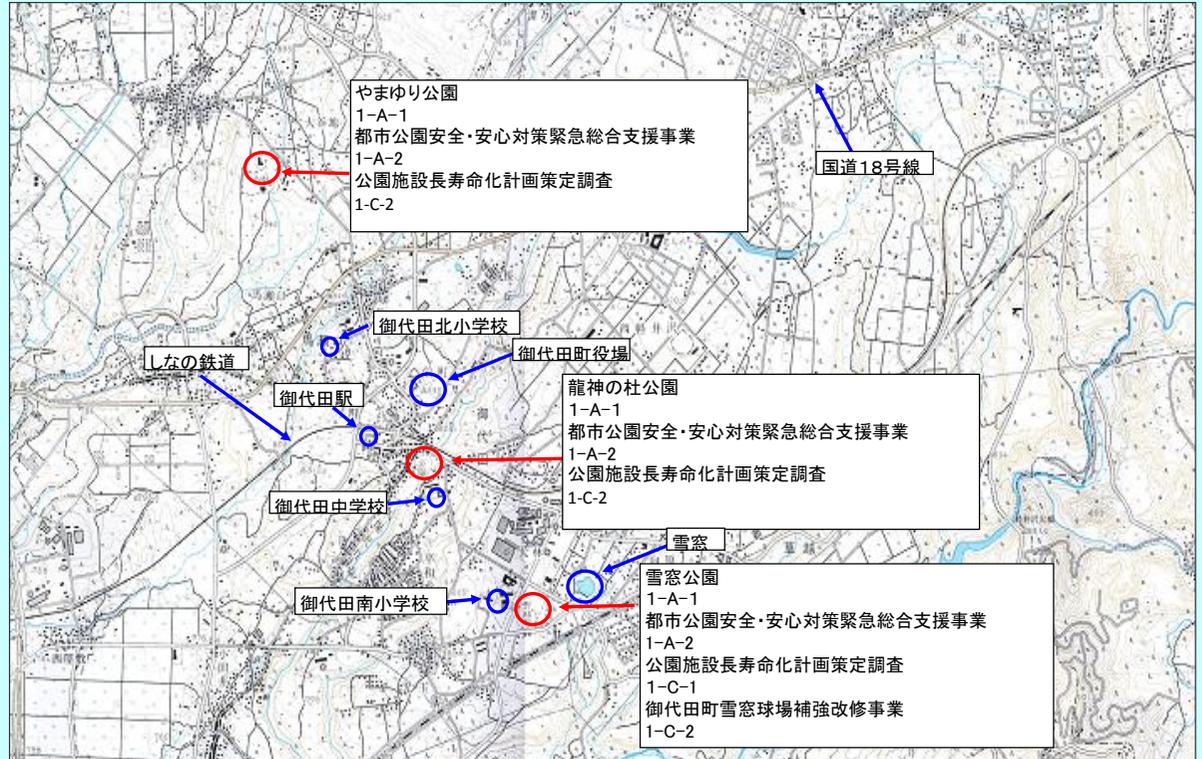

課題の変化	本計画による事業実施により、3都市公園の園路・駐車場について、バリアフリー化を図ることができた。しかしながら、龍神の杜公園については、バリアフリー化により園路改修した部分(弾性舗装)とバリアフリー化の必要が無かった、今回改修しなかった部分の園路舗装が異なるものとなっている。今回改修しなかった園路部分については、劣化による損傷もあることから、今回整備した舗装と同様の弾性舗装改修が課題となる。
今後の方策 (改善策を含む)	より安全で快適な公園空間の形成を図るため、龍神の杜公園園路の未改修区間の改修を促進する。

1 成果の評価

計画に記載した目標の変更の有無

	変更		変更前	変更後	変更理由
	あり	なし			
計画の目標		●			
計画の成果目標	●		①都市公園のバリアフリー率を100%にする。	①都市公園のバリアフリー率を100%にする。 ②改善必要な施設の改修率を100%にする。	計画の目標達成のため、機能が著しく低下している施設の改修が必要が生じたため②を追加した。
定量的指標の目標値	●		指標1 年度別のバリアフリー整備公園数 3箇所 100%	指標1 年度別のバリアフリー整備公園数 3箇所 100% 指標2 年度別の改修施設公園数 1箇所 100%	計画の目標達成のため、機能が著しく低下している施設の改修が必要が生じたため指標2を追加した。

要素事業の進捗状況

A 基幹事業									
番号	要素事業(事業箇所)	当初計画		最終変更計画		当初計画からの 変更の概要 ※1 (事業の削除・追加を含む)	目標を定量化する指標、数値目標等への影響	事後評価時の完成状況	
		事業費	事業内容	事業費	事業内容			完成	完成見込み
1-A-1	都市公園安全・安全対策緊急総合支援事業	42.0	3都市公園12.6ha/バリアフリー化等	56.5	3都市公園12.6ha/バリアフリー化等	トイレ、遊具等に関し検討する中で仕様変更等による事業費の増加	なし	●	
1-A-2	公園施設長寿命化計画策定調査	4.0	3都市公園12.6ha長寿命化計画策定	4.0	3都市公園12.6ha長寿命化計画策定	なし	なし	●	
B 関連社会資本整備事業									
番号	要素事業(事業箇所)	当初計画		最終変更計画		当初計画からの 変更の概要 ※1 (事業の削除・追加を含む)	目標を定量化する指標、数値目標等への影響	事後評価時の完成状況	
		事業費	事業内容	事業費	事業内容			完成	完成見込み
C 効果促進事業									
番号	要素事業(事業箇所)	当初計画		最終変更計画		当初計画からの 変更の概要 ※1 (事業の削除・追加を含む)	目標を定量化する指標、数値目標等への影響	事後評価時の完成状況	
		事業費	事業内容	事業費	事業内容			完成	完成見込み
1-C-1	御代田町防犯灯改修事業	1.0	3都市公園周辺の防犯灯改修	—	—	周辺道路整備により実施することから削除した。	なし	—	—
1-C-1	御代田町雷窓球場補強改修事業	—	—	12.0	雷窓公園内野球場スタンド改修	雷窓公園内野球場のバリアフリー化に合わせて、備蓄倉庫となっている管理等屋根のスタンドを改修し、倉庫としての機能を向上させるため追加した。	あり。新規指標の追加	●	
1-C-2	移動円滑化園路等表示看板設置事業	—	—	2.5	3都市公園12.6ha看板設置	移動円滑化園路等を看板により表示することにより、バリアフリー化の効果をより一層高めることができたため追加した。	なし	●	

計画に記載した数値目標の達成状況

指 標		単位	算定式	(参考) ※1 計画以前の値 (ア)		従前値 (イ)		目標値 (ウ)		数値 (エ)	目標達成度※2		1年以内の 達成見込みの 有無		
				基準 年度	基準 年度	基準 年度	目標 年度	あり	なし						
指標 1	年度別のバリアフリー整備公園数	箇所 %	バリアフリー化率=バリアフリー整備公園数/都市公園数	0箇所	H22	0箇所	H22	3箇所	H24	事後評価	確定 ●	3箇所	事後評価	○	
				0%		0%		100%			見込み	100%			
指標 2	年度別の改修施設公園数	箇所 %	改修率=改修施設公園数/都市公園数	0箇所	H22	0箇所	H22	1箇所	H24	事後評価	確定 ●	1箇所	事後評価	○	
				0%		0%		100%			見込み	100%			
指 標	目標達成度○△×の理由 (達成見込み「あり」とした場合、その理由も含む)								その他特記事項 (指標計測上の問題点、課題等)						
指標 1	事業実施により目標を達成した。														
指標 2	事業実施により目標を達成した。														

※1 計画以前の値 とは、都市再生整備計画の作成より以前(概ね10年程度前)の値のことをいう。

※2 目標達成度の記入方法

○: 評価値が目標値を上回った場合

△: 評価値が目標値には達していないものの、近年の傾向よりは改善していると認められる場合

数値目標を達成した指標にかかる効果発現要因の整理

指標の種別		指標1		指標2							
指標名		年度別のバリアフリー整備公園数		年度別の改修施設公園数							
種別	事業名・箇所名	指標改善への貢献度	総合所見	指標改善への貢献度	総合所見	指標改善への貢献度	総合所見	指標改善への貢献度	総合所見		
基幹事業	都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	◎	園路の段差解消、階段部分の手すり設置、多目的トイレの整備、車いす利用者駐車スペースの確保等都市公園移動円滑化整備ガイドラインに沿った整備により、指標達成となった。	—	雨水対策等改修の必要であった備蓄倉庫（雪窓公園野球場スタンド）を改修したことで指標達成となった。						
	公園施設長寿命化計画策定調査	○		—							
関連事業											
効果促進事業	御代田町雪窓球場補強改修事業	—				◎					
	移動円滑化園路等表示看板設置事業	○		—							

※指標改善への貢献度

- ◎：事業が効果を発揮し、指標の改善に直接的に貢献した。
- ：事業が効果を発揮し、指標の改善に間接的に貢献した。
- △：事業が効果を発揮することを期待したが、指標の改善に貢献しなかった。
- ：事業と指標の間には、もともと関係がないことが明確なので、評価できない。

今後の活用	策定した公園施設長寿命化計画に基づき、適正な維持管理を推進していく。	改修した備蓄倉庫の活用を進める。		
-------	------------------------------------	------------------	--	--

しゃかいしほんそうごうせいびけいかくしょ
社会資本総合整備計画書

ながのけん みよたまち
長野県 御代田町

平成23年10月12日

(様式2) 社会資本総合整備計画 (都市公園等事業)

平成23年10月12日

計画の名称	1 御代田町都市公園再整備事業		
計画の期間	平成22年度 ~ 平成24年度 (3年間)	交付対象	御代田町
計画の目標			

御代田町は、活火山の浅間山の南麓に広がる地域に位置し、火山性異常気象が間欠的に発生しており噴火等の災害が予想される。また、急峻な地形であることから、豪雨などによる土砂崩落なども度々発生しており避難勧告を行った経過もある。これらの災害が発生した場合、公園は避難所として重要な公共施設であることから、施設の機能保全及び向上対策により災害に強い安全なまちづくりを目標とする。また、現施設が都市公園移動等円滑化基準に該当しない箇所や公園遊具の危険度判定調査により改善が必要な箇所があることから、子どもや高齢者をはじめ誰もが安全で安心して利用できるよう整備を行う。

計画の成果目標 (定量的指標)

- ・都市公園のバリアフリー化率を100%にする。
- ・改善が必要な施設の改修率を100%にする。

定量的指標の定義及び算定式

年度別のバリアフリー整備箇所を算出する。
 (バリアフリー化率) = (バリアフリー整備公園数) / (都市公園数)

年度別の改修施設箇所を算出する。
 (改修率) = (改修施設公園数) / (都市公園数)

定量的指標の現況値及び目標値			備考
当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (H23末)	最終目標値 (H24末)	
0箇所 0%		3箇所 100%	
0箇所 0%		1箇所 100%	

全体事業費	合計 (A+B+C)	75百万円	A	60.5万円	B	0円	C	14.5百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	19.3%
-------	---------------	-------	---	--------	---	----	---	---------	---------------------------	-------

交付対象事業

A1 基幹事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H22	H23	H24	H25	H26		
1-A-1	公園	一般	御代田町	直接	御代田町	都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	3都市公園12.6haバリアフリー化等	御代田町						56.5	
1-A-2	公園	一般	御代田町	直接	御代田町	公園施設長寿命化計画策定調査	3都市公園12.6ha長寿命化計画策定	御代田町						4	
合計											60.5				

B 関連社会資本整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H22	H23	H24	H25	H26		
合計															

番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考

C 効果促進事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H22	H23	H24	H25	H26		
1-C-1	公園	一般	御代田町	直接	御代田町	御代田町雪窓球場補強改修事業	雪窓公園内野球場スタンド改修	御代田町						12.0	
1-C-2	公園	一般	御代田町	直接	御代田町	移動円滑化園路等表示看板設置事業	3都市公園12.6ha看板設置	御代田町						2.5	
合計											14.5				

番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考
1-C-1	雪窓公園内野球場のバリアフリー化に併せて、備蓄倉庫となっている管理棟の屋根となっているスタンドを改修することで倉庫としての機能を向上することができる。										
1-C-2	看板で移動御円滑化園路等を標記することで誰もが安心して公園を利用することができる。										

(様式3) 都市公園等整備事業

計画の名称	1 御代田町都市公園再整備事業	交付対象	御代田町
計画の期間	平成22年度 ~ 平成24年度 (3年間)		

